

#3^{ème} trimestre 2024

ACTIVITES DE CHANTIER SUR LA PERIODE

Sur le site de la Praz :

- ✓ *Poursuite de l'aménagement de la plateforme* : Montage des tours de transferts, déplacement du local UDR et terrassements divers (fondations de l'atelier du Train Sur Pneus, etc.).
- ✓ *Future zone de réception et stockage des agrégats* : Poursuite des opérations de génie civil.
- ✓ *En souterrain* : Poursuite de l'excavation des galeries de connexion (4 fronts en juillet puis passage à 2 fronts mi-août), réalisation des équipements annexes (réseaux, conduite d'eaux exhaure, bandes transporteuses).

Sur le site de Saint-Martin-La-Porte :

- ✓ *Poursuite de l'aménagement de la plateforme* : Poursuite des travaux de montage de la station de traitement des eaux définitive, réception de la nouvelle centrale à béton et lancement production de béton fin juillet, démontage ancienne centrale de SMP4. Génie civil du parc agrégats (dalles réalisées ; montage des parois). Dernière phase de réalisation des enrobés de secteurs non encore pourvus à la fin de l'été.
- ✓ *En souterrain* : Travaux au sein de la galerie logistique, caverne technique, rameaux. Mise en sécurité, mise en place des ancrages des convoyeurs et ventilation. Travaux d'abaissement du radier sur certains tronçons.
- ✓ *Bandes transporteuses* : Poursuite du montage des convoyeurs et des tours de transfert 1, 2, 3 et 4.

LOCALISATION DES POINTS DE SUIVI DES RETOMBÉES DE POUSSIÈRES

La Praz



Saint-Martin-La-Porte




Méthode de mesure des retombées de poussières selon la norme NF X 43-014 : suivi en continu par prélèvement sur jauges pendant une durée de 1 mois, analyse de la quantité de poussières collectées.

APPRECIATION GENERALE SUR LES EMISSIONS DE POUSSIÈRES


La Praz

Les niveaux de retombées de poussières sont conformes pour tous les points sur le 3^{ème} trimestre 2024. Un seul signalement est enregistré.

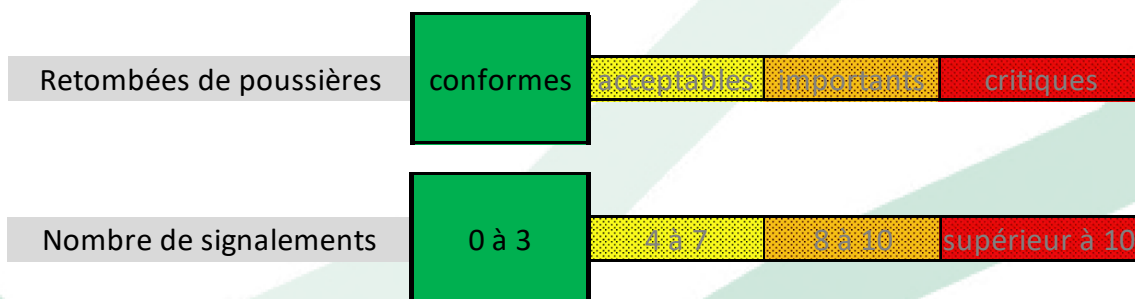

Saint-Martin-La-Porte

Les niveaux de retombées de poussières sont conformes pour tous les points sur le 3^{ème} trimestre, sauf pour un point en limite de plateforme. Aucun signalement n'est enregistré.

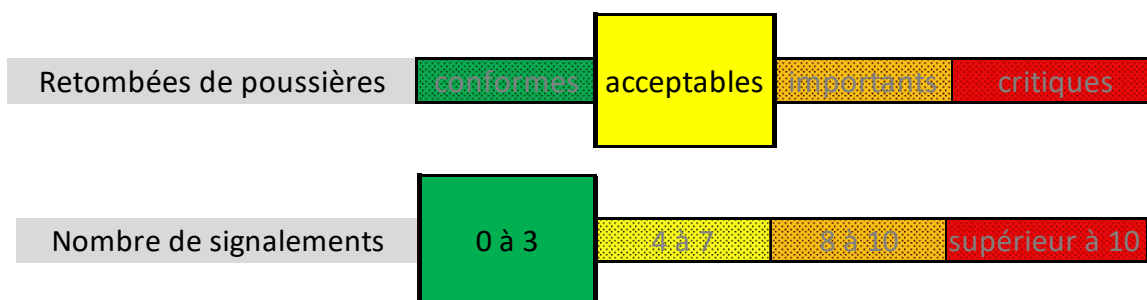

SYNTHESE DES MESURES

La Praz

ANNEE 2024	juil-24	août-24	sept-24
Conformité des valeurs mesurées (% de valeurs sous la référence de 500 mg/m ² .jour) (1)	100%	100%	100%
Nombre de signalements de riverains liés aux émissions de poussières	1	0	0

Saint-Martin-La-Porte

ANNEE 2024	juil-24	août-24	sept-24
Conformité des valeurs mesurées (% de valeurs sous la référence de 500 mg/m ² .jour) (1)	80%	100%	100%
Nombre de signalements de riverains liés aux émissions de poussières	0	0	0

(1) 500 mg/m².jour est le seuil applicable aux carrières classées à autorisation préfectorale au titre des ICPE et pris en référence pour les installations de TELT en l'absence de seuils réglementaires explicites sur les retombées de poussières. Il concerne les points de mesure implantés à proximité immédiate des premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des premières habitations situées à moins de 1500 mètres des limites de propriétés de l'exploitation, sous les vents dominants. Par simplification ce seuil est appliqué à tous les points surveillés hors point témoin de manière à évaluer l'impact du chantier.


Réglementairement les concentrations à évaluer doivent être exprimées en moyenne annuelle (moyenne des valeurs mesurées sur les 12 derniers mois).

#3ème trimestre 2024

PLUS DANS LE DETAIL...


La Praz

Les niveaux de concentrations sont inférieurs à 200 mg/m². La valeur moyenne sur le trimestre pour chaque point varie de 100 à 121 mg/m².jour, bien en dessous de la valeur de 500 mg/m².jour prise en référence.

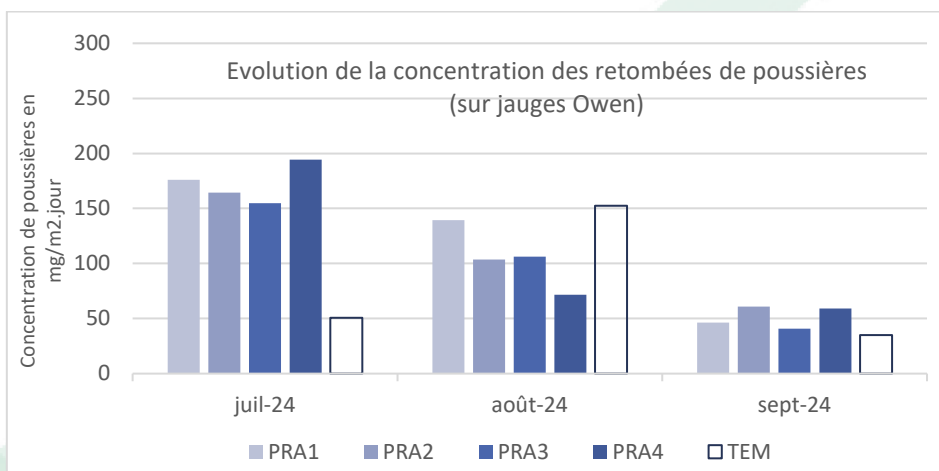

Saint-Martin-La-Porte

Les niveaux de concentrations sont globalement inférieurs à 200 mg/m².jour sur la période, sauf pour une jauge en juillet où la valeur de 1247 mg/m².jour est atteinte. Cela est très certainement dû aux travaux d'aménagement et de nettoyage de la station de traitement des eaux proche de la jauge.

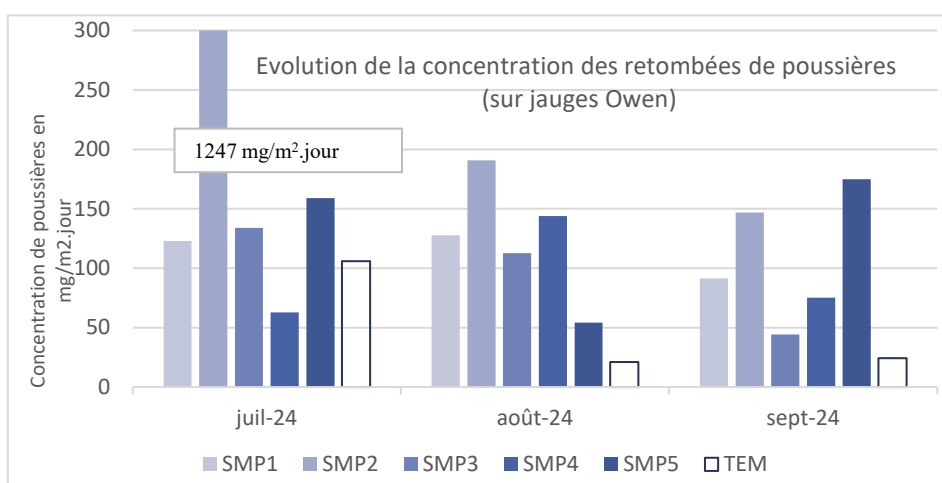

#3^{ème} trimestre 2024

FOCUS SUR LES SIGNALEMENTS DES RIVERAINS

La Praz

Un seul signalement concernant les émissions de poussières autour de la plateforme de la Praz a été répertorié au 3^{ème} trimestre 2024.

Date	Description de la nuisance	Localisation de la nuisance	Sources du chantier à l'origine de la nuisance	Actions correctives
30/07/2024	Poussières provenant du chantier : si demain la piscine est pleine de poussière on saura d'où ça vient	Lotissement EDF	Stockage des matex	Les pistes du chantier et les casiers MATEX sont arrosés en permanence afin d'éviter l'empoussièrément. Le chantier dispose également de brumisateurs, de tonne à eau. Malgré cela, les conditions météo extrêmes de fin juillet (températures élevées et vents forts) ont contribué à l'envolée des poussières. La nuit, pas de personnel dédié au travail en plateforme. L'évacuation des MATEX par bande transporteuse améliorera la situation.

Saint-Martin-La-Porte

Aucun signalement concernant les émissions de poussières autour de la plateforme à Saint-Martin-la-Porte n'a été répertorié au 3^{ème} trimestre 2024.

TELT reste attentif aux besoins des riverains pour remédier aux situations de gêne occasionnée par les émissions de poussières générées par le chantier.

Un numéro unique est à votre disposition pour signaler d'éventuelles nuisances :
04 85 98 98 98
